Project Plan

Version: 1.0

VoteGR



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέλη ομάδας	2
Τυπικά Υποέργα	3
Gantt chart	4
Pert chart	Ę
Κατανομή Προσωπικού	6
Εκτίμηση κόστους	6
Αμοιβή Μηχανικών	6
Έξοδα εξοπλισμού	7

Μέλη ομάδας

ΕΠΩΝΥΜΟ	ONOMA	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καραβοκύρης	Μιχαήλ	1059636	4°
Κουνέλης	Αγησίλαος	1059637	4°
Κουτσοχέρας	Ιωάννης	1059638	4°
Παπαχρονόπουλος	Γεράσιμος	1059629	4°

Editor: Καραβοκύρης Μιχαήλ

Peer Reviewers: Κουνέλης Αγησίλαος, Παπαχρονόπουλος Γεράσιμος

Τυπικά Υποέργα¹


Τυπικό Υποέργο	Περιγραφή	
TY 1	Περιγραφή και ανάλυση του έργου	
TY 2	Σχεδίαση των λειτουργιών του έργου	
TY 3	Σχεδίαση περιβάλλοντος διεπαφής	
TY 4	Σχεδίαση βάσης δεδομένων	
TY 5	Εκτίμηση Εργαλείων	
TY 6	Ανάπτυξη κώδικα για τις λειτουργίες του έργου	
TY 7	Ανάπτυξη βάσης δεδομένων	
TY 8	Ανάπτυξη περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη	
TY 9	Ολοκλήρωση και έλεγχος ορθής λειτουργίας έργου	
TY 10	Αξιολόγηση από τον πελάτη	
TY 11	Τροποποιήσεις όπου χρειάζεται	
TY 12	Αποδοχή και Εγκατάσταση	

Δ ραστηριότητα	Αισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας	Κανονική εκτίμηση διάρκειας	Απαισιόδοξη Εκτίμηση διάρκειας	Προαπαιτούμενες εργασίες	Αναμενόμενη Διάρκεια
TY 1	17	20	23	-	20
TY 2	7	10	14	TY 1	11
TY 3	5	7	12	TY 2	8
TY 4	5	7	12	TY 2	8
TY 5	3	5	7	TY2 ,TY3, TY4	5
TY 6	30	35	42	TY 5	36
TY 7	12	14	20	TY 5	15
TY 8	15	18	20	TY 5	18
TY 9	10	15	18	TY 6, TY7, TY8	15


¹ Η εκτίμηση διάρκειας μετριέται σε ημέρες Αναμενόμενη διάρκεια = (Αισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας + 4*Κανονική εκτίμηση διάρκειας + απαισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας)/6

TY 10	3	5	7	TY 10	5
TY 11	5	10	15	TY10, TY 11	10
TY 12	3	5	7	TY 11	5

Gantt chart²

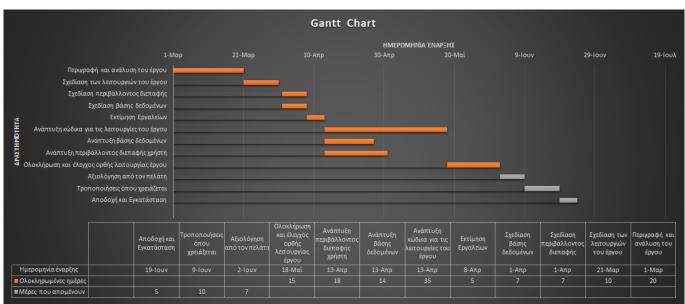

Pert chart³




 $^{^{2}}$ Δημιουργήθηκε στο excel

⁻Χρησιμοποιήθηκε η κανονική εκτίμηση διάρκειας των τυπικών υποέργων

 $^{^{\}scriptscriptstyle 3}$ Δημιουργήθηκε με diagrams.net



Κατανομή Προσωπικού⁴

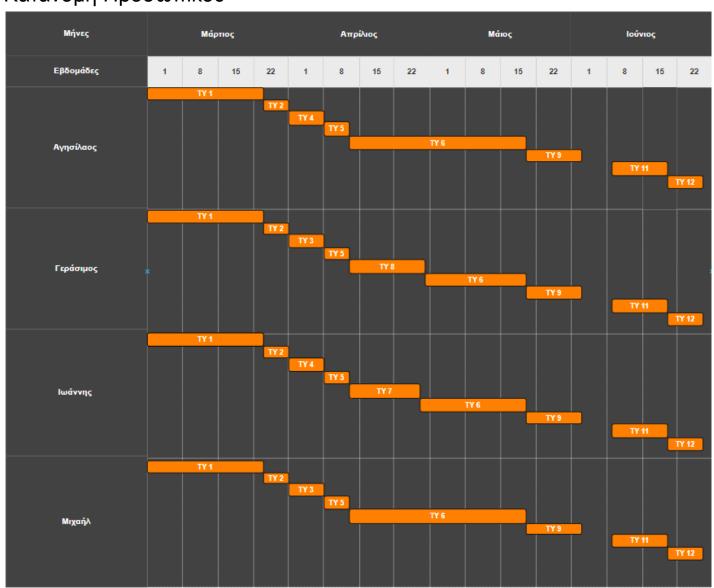

⁴Το διάγραμμα δημιουργήθηκε στο diagrams.net

⁻Όλα τα μέλη της ομάδας είναι full-time committed στο έργο -Στο "κενό" πραγματοποιείται ο έλεγχος από τον πελάτη.

Εκτίμηση κόστους

1. Αμοιβή Μηχανικών

Μηνιαία αμοιβή: 1400€
Αριθμός υπαλλήλων: 4
Διάρκεια έργου: 4 μήνες
Σύνολο: 1400*4*4 = 22.400€

2. Έξοδα εξοπλισμού

• Ενοικίαση γραφείου εταιρείας: 600€

• Υπολογιστές για τους υπαλλήλους: 650€

Ενοικίαση Server: Στο <u>Dedicated Hosting - Dedicated Servers for Your Site</u> η ενοικίαση ενός Enterprise Server κοστίζει 140€ το μήνα. Μέχρι την κυκλοφορία του έργου, δεδομένου ότι τον πρώτο μήνα δεν χρειάζεται ενοικίαση server, το κόστος ανέρχεται στα 140*3 = 420€

Σύνολο: 600*4 + 650*4 + 420 = 5.420 €

Συνολικό Κόστος: 22.400 + 5.420 = 27.820€
